GANTT OBRA FATIMA
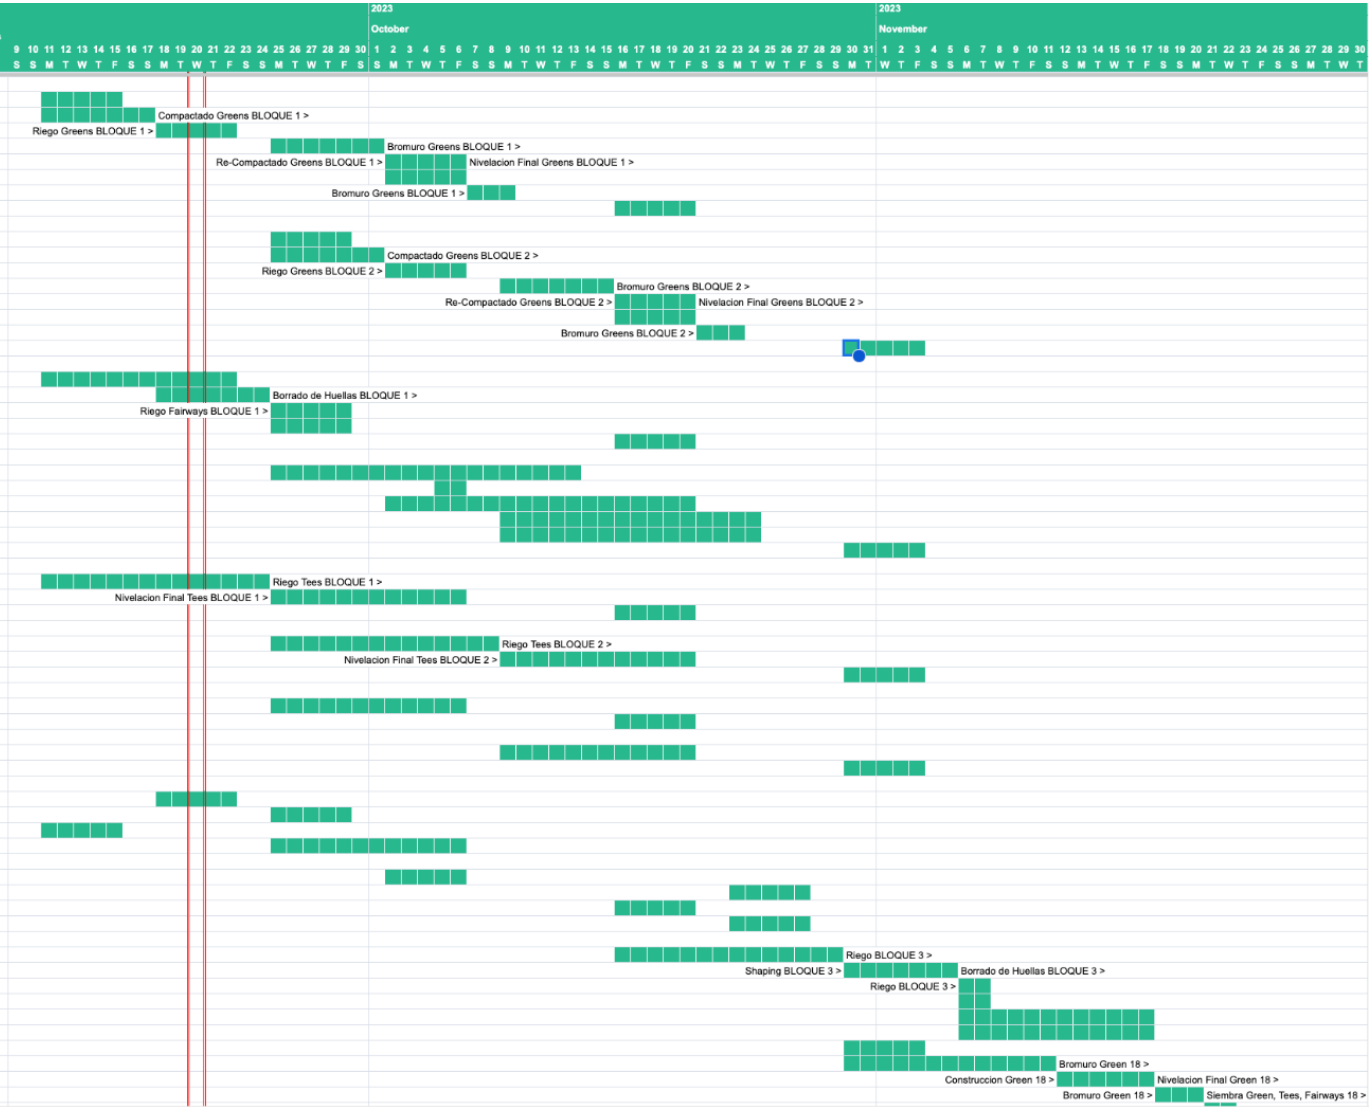
ID	Work Breakdown Structure	Start (BLOQUE 1 HOYOS 10-13)	End (BLOQUE 2 HOYOS 14-17)	Person (BLOQUE 3 HOYO 18 + CHIPPING)	Progress	Dependency	Days
1	Rotovator Greens BLOQUE 1	11-Sep	15-Sep	Malanas	100%		5
2	Riego Greens BLOQUE 1	11-Sep	17-Sep	Houriet	75%		7
3	Compactado Greens BLOQUE 1	18-Sep	22-Sep	Claudio M	50%	2 - Riego Greens BLOQUE 1	5
4	Re-Compactado Greens BLOQUE 1	25-Sep	1-Oct	Claudio M	0%		7
5	Bromuro Greens BLOQUE 1	2-Oct	6-Oct	Goodacre	0%	4 - Re-Compactado Greens BLO	5
6	Sacado Panes Collares BLOQUE 1	2-Oct	6-Oct	Caprile Manual	0%		5
7	Nivelacion Final Greens BLOQUE 1	7-Oct	9-Oct	Diego True	0%	5 - Bromuro Greens BLOQUE 1	3
8	Siembra Greens BLOQUE 1	16-Oct	20-Oct	Claudio M	0%		5
9	Rotovator Greens BLOQUE 2	25-Sep	29-Sep	Malanas	0%		5
10	Riego Greens BLOQUE 2	25-Sep	1-Oct	Houriet	0%		7
11	Compactado Greens BLOQUE 2	2-Oct	6-Oct	Claudio M	0%	10 - Riego Greens BLOQUE 2	5
12	Re-Compactado Greens BLOQUE 2	9-Oct	15-Oct	Claudio M	0%		7
13	Bromuro Greens BLOQUE 2	16-Oct	20-Oct	Goodacre	0%	12 - Re-Compactado Greens BL(	5
14	Sacado Panes Collares BLOQUE 2	16-Oct	20-Oct	Caprile Manual	0%		5
15	Nivelacion Final Greens BLOQUE 2	21-Oct	23-Oct	Diego True	0%	13 - Bromuro Greens BLOQUE 2	3
16	Siembra Greens BLOQUE 2	30-Oct	3-Nov	Claudio M	0%		5
17	Shaping Fairways BLOQUE 1	11-Sep	22-Sep	Caprile Shaper	90%		12
18	Riego Fairways BLOQUE 1	18-Sep	24-Sep	Houriet	75%		7
19	Borrado de Huellas BLOQUE 1	25-Sep	29-Sep	Caprile Manual	0%	18 - Riego Fairways BLOQUE 1	5
20	Pasado de Rastra BLOQUE 1	25-Sep	29-Sep	Caprile Manual	75%		5
21	Siembra Fairways BLOQUE 1	16-Oct	20-Oct	Cynodon	0%		5
22	Shaping Fairways BLOQUE 2	25-Sep	13-Oct	Caprile Shaper	50%		19
23	Laguna Hoyo 17	5-Oct	6-Oct	Caprile Shaper	30%		2
24	Riego Fairways BLOQUE 2	2-Oct	20-Oct	Houriet	0%		19
25	Borrado de Huellas BLOQUE 2	9-Oct	24-Oct	Caprile Manual	0%		16
26	Pasado de Rastra BLOQUE 2	9-Oct	24-Oct	Caprile Manual	0%		16
27	Siembra Fairways BLOQUE 2	30-Oct	3-Nov	Cynodon	0%		5
28	Nivelacion Final Tees BLOQUE 1	11-Sep	24-Sep	Caprile Manual	50%		14
29	Riego Tees BLOQUE 1	25-Sep	6-Oct	Houriet	50%	28 - Nivelacion Final Tees BLOQ	12
30	Siembra Estolones Tees BLOQUE 1	16-Oct	20-Oct	Claudio M	0%		5
31	Nivelacion Final Tees BLOQUE 2	25-Sep	8-Oct	Caprile Manual	25%		14
32	Riego Tees BLOQUE 2	9-Oct	20-Oct	Houriet	0%	31 - Nivelacion Final Tees BLOQ	12
33	Siembra Estolones Tees BLOQUE 2	30-Oct	3-Nov	Claudio M	0%		5
34	Riego Entornos BLOQUE 1	25-Sep	6-Oct	Houriet	35%		12
35	Siembra SEMILLAS Entornos BLOQUE 1	16-Oct	20-Oct	Claudio M	0%		5
36	Riego Entornos BLOQUE 2	9-Oct	20-Oct	Houriet	0%		12
37	Siembra SEMILLAS Entornos BLOQUE 2	30-Oct	3-Nov	Claudio M	0%		5
38	Empanado Bunkers BLOQUE 1	18-Sep	22-Sep	Claudio M	0%		5
39	Empanado Cross Bunkers BLOQUE 1	25-Sep	29-Sep	Claudio M	0%		5
40	Zanja de Drenaje Bunkers BLOQUE 1	11-Sep	15-Sep	Caprile Manual	100%		5
41	Piedra y Caños Drenaje Bunkers BLOQUE 1	25-Sep	6-Oct	Caprile Manual	0%		12
42	Empanado Bunkers BLOQUE 2	2-Oct	6-Oct	Claudio M	0%		5
43	Empanado Cross Bunkers BLOQUE 2	23-Oct	27-Oct	Claudio M	0%		5
44	Zanja de Drenaje Bunkers BLOQUE 2	16-Oct	20-Oct	Caprile Manual	25%		5
45	Piedra y Caños Drenaje Bunkers BLOQUE 2	23-Oct	27-Oct	Caprile Manual	0%		5
46	Shaping BLOQUE 3	16-Oct	29-Oct	Caprile Shaper	0%		14
47	Riego BLOQUE 3	30-Oct	5-Nov	Houriet	0%	46 - Shaping BLOQUE 3	7
48	Borrado de Huellas BLOQUE 3	6-Nov	7-Nov	Caprile Manual	0%	47 - Riego BLOQUE 3	2
49	Pasado de Rastra BLOQUE 3	6-Nov	7-Nov	Caprile Manual	0%		2
50	Empanado Bunkers y Cross Bunkers	6-Nov	17-Nov	Claudio M	0%		12
51	Empanado Entorno Green 18	6-Nov	17-Nov	Claudio M	0%		12
52	Nivelacion Tees Hoyo 18	30-Oct	3-Nov	Caprile Manual	0%		5
53	Construccion Green 18	30-Oct	11-Nov	Caprile Manual	0%		13
54	Bromuro Green 18	12-Nov	17-Nov	Goodacre	0%	53 - Construccion Green 18	6
55	Nivelacion Final Green 18	18-Nov	20-Nov	Diego True	0%	54 - Bromuro Green 18	3
